

INTERSECCIÓN EN MICHIGAN MEJORAS A LAS CALLES LOCALES

Las actividades relacionadas con la Intersección de Michigan incluyen mejoras a calles locales. Estas mejoras incluyen:

Reconstrucción y realineación de:

- Green Street desde la I-75 hasta W. Jefferson Avenue, incluido un bulevar desde Norfolk Southern Railway hasta W. Jefferson Avenue (en marcha)
- Campbell Street desde la I-75 hasta W. Jefferson Avenue, incluido un bulevar desde Norfolk Southern Railway hasta W. Jefferson Avenue (en marcha)
- Livernois Avenue desde la I-75 hasta la calle sin salida, con la construcción de una calle sin salida y conversión a tráfico de doble sentido (desde Fort Steet sur) (en marcha)



Reconstrucción y reconfiguración de las siguientes intersecciones:

- West End Street y Fort Street (completa)
- West End Street y W. Jefferson Avenue (completa)
- Dearborn Street y W. Jefferson Avenue
- Clark Street y Fort Street (completa)
- Clark Street y W. Jefferson Avenue (completa)


Se realizará repavimentación en:

- Las vías laterales de la I-75 (Service Drives) en dirección este y oeste desde West End Street hasta Clark Street
- Fort Street desde Junction Avenue hasta Green Street (en marcha)
- Cavalry Street: construcción de una nueva calle sin salida en el término sur
- W. Jefferson Avenue desde Campbell Street hasta West End Street (en marcha).

ETAPAS Y CRONOGRAMA DE MEJORAS A LA CALLE DE FORT STREET

Se está repavimentando **Fort Street** desde **Green Street** hasta **Junction Street** como parte del proyecto de mejoras a las calles locales. Esto incluirá la repavimentación del camino así como la reconstrucción de bordillos, aceras y carriles para bicicletas.

Este trabajo se está llevando a cabo en etapas y requerirá el cierre de carriles a lo largo de Fort Street.

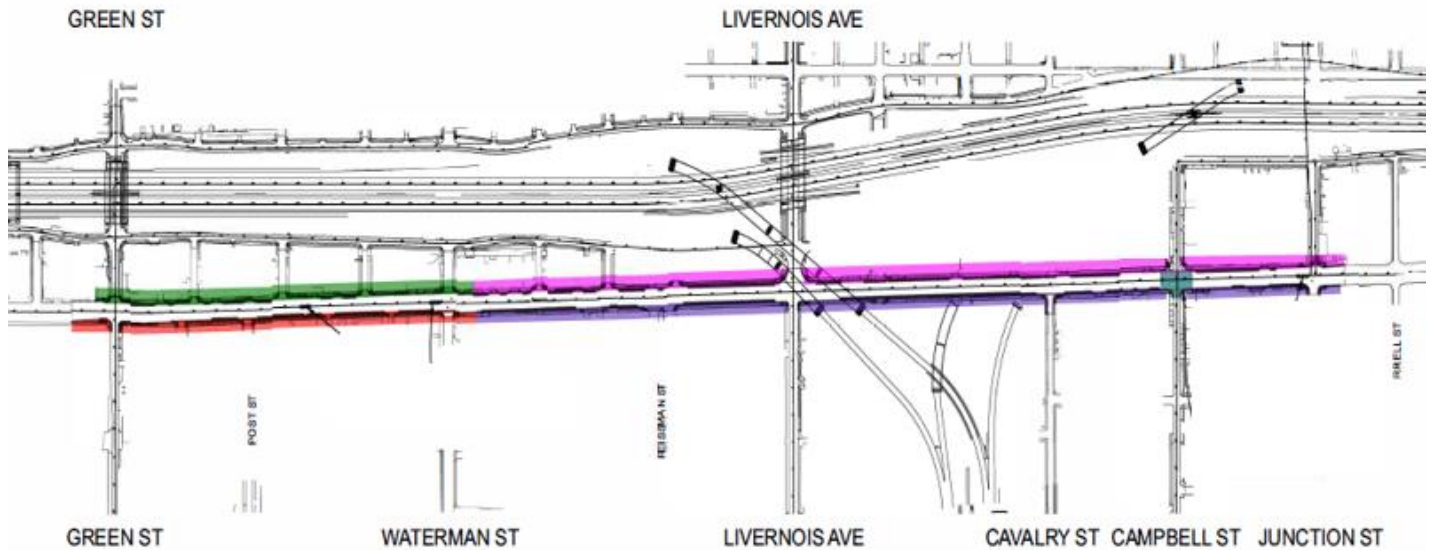

FORT STREET HACIA EL ESTE

Plazos previstos: Enero – Verano 2024

- Actualmente se está realizando trabajo entre Green Street y Waterman Street.
- Actualmente se está realizando trabajo entre Waterman Street y Junction Street.
- Se prevé que la intersección entre Fort Street y Campbell Street comience en la primavera de 2024.

FORT STREET HACIA EL OESTE

Plazos previstos: Primavera 2024 – Otoño 2024

- Se prevé que la sección entre Green Street y Waterman Street comience en la primavera de 2024.
- Se prevé que la sección entre Waterman Street y Junction Street comience en el verano de 2024.

Para obtener información adicional sobre el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe visite www.GordieHoweInternationalBridge.com o llame al 1-844-322-1773.

Síguenos en Twitter en www.twitter.com/GordieHoweBrg, conviértase en fan en Facebook en www.facebook.com/GordieHoweBridge y póngase en contacto con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/wdba-apwd.
